



St 2309 Bau einer Ortsumfahrung Kleinwallstadt mit Neubau Mainbrücke südlich Kleinwallstadt







Tagesordnungspunkte „TOPs“

1. Visualisierung
2. Planänderungen
3. Rückblick
4. Aktueller Maßnahmenstand
5. Ausblick 2025



1. Visualisierung

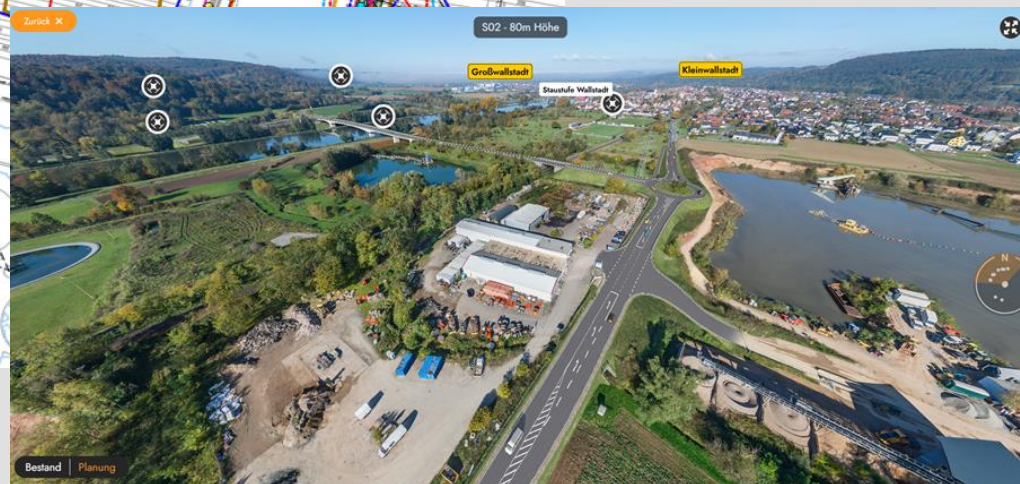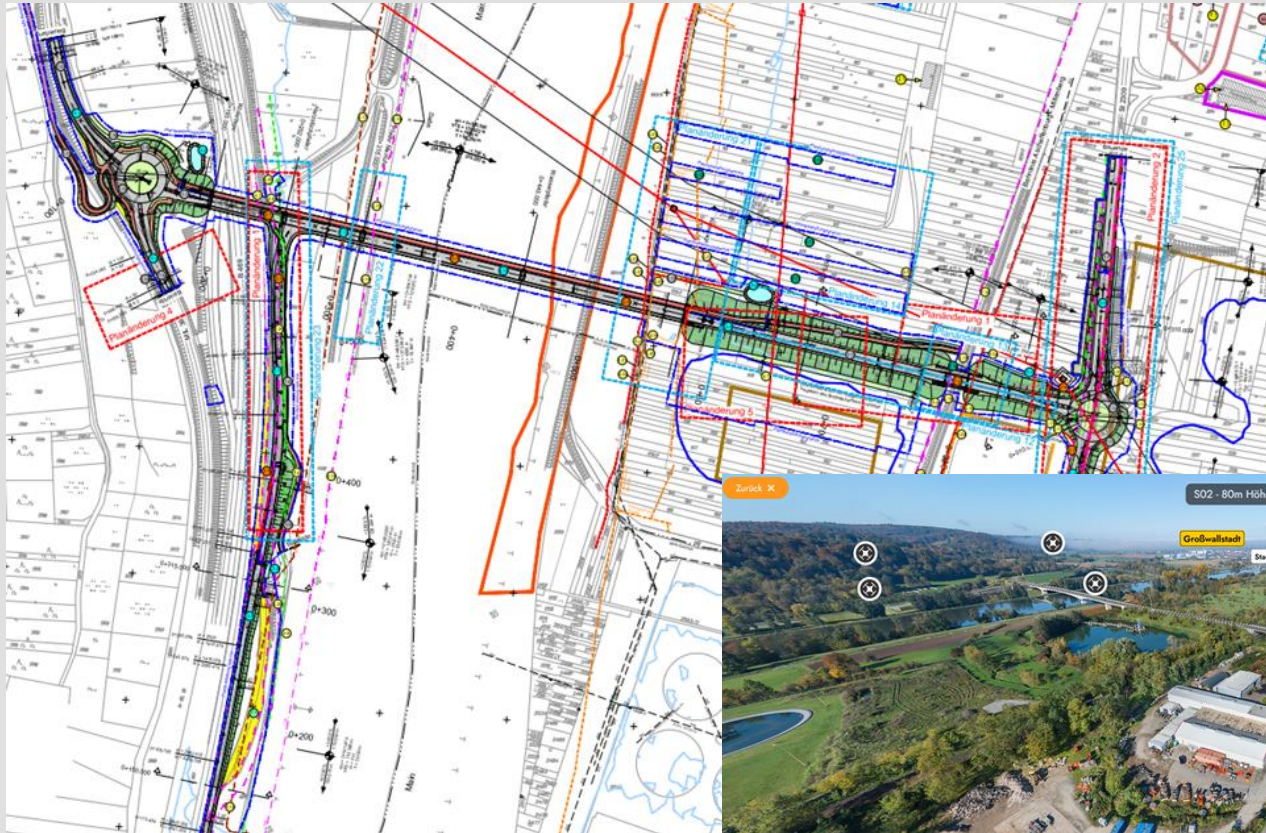



<https://p568-0001.projekt.web.vismo.media/>



1. Visualisierung

Die Visualisierung zeigt das Gesamtprojekt mit den abgestimmten Planänderungen zur Optimierung der Brücke bzw. der Baumaßnahme.


Pfeilerstellung Planfeststellung

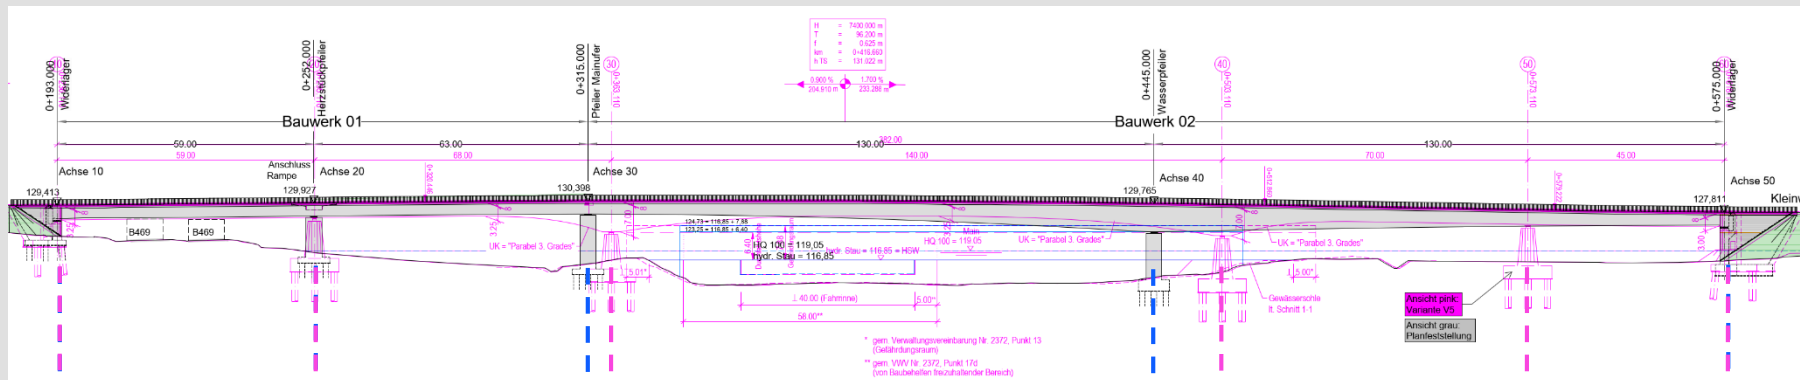

Pfeilerstellung nach Planänderung

1. Visualisierung

Die Visualisierung zeigt den Endzustand mit den Planänderungen.

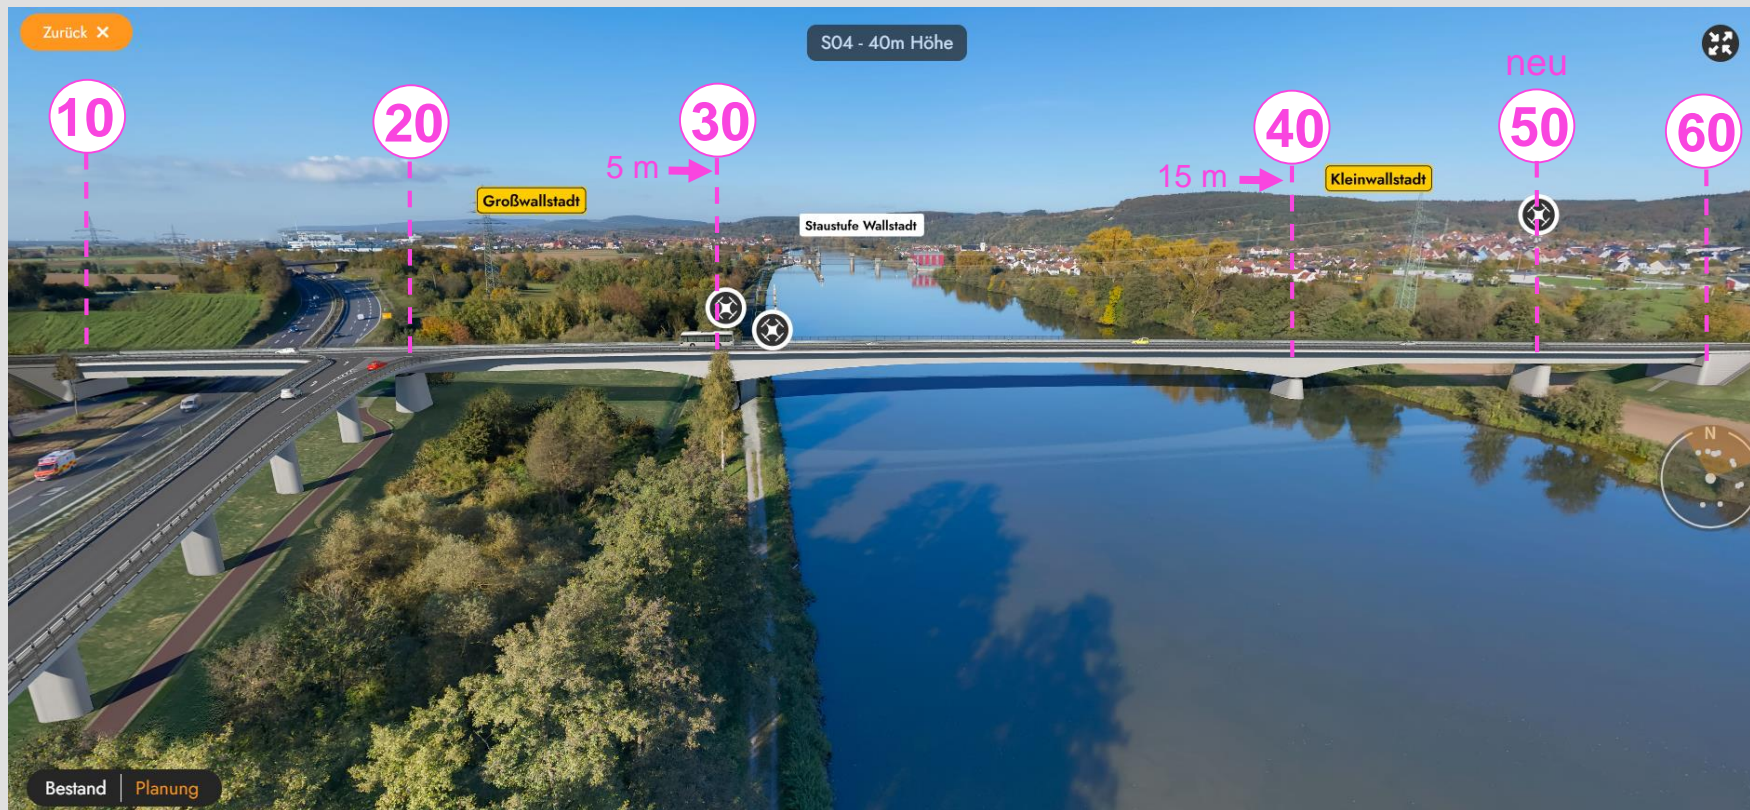




2. Planänderungen

am Bauwerk selbst (Endzustand)

- Optimierung Pfeilerstellung / Voutung Überbau
- Tiefgründung Widerlager Ost

temporär (für die Bauzeit)

- Arbeitsebene im Main
- Vergrößerung Baufeld
- Gründung Hilfsstützen

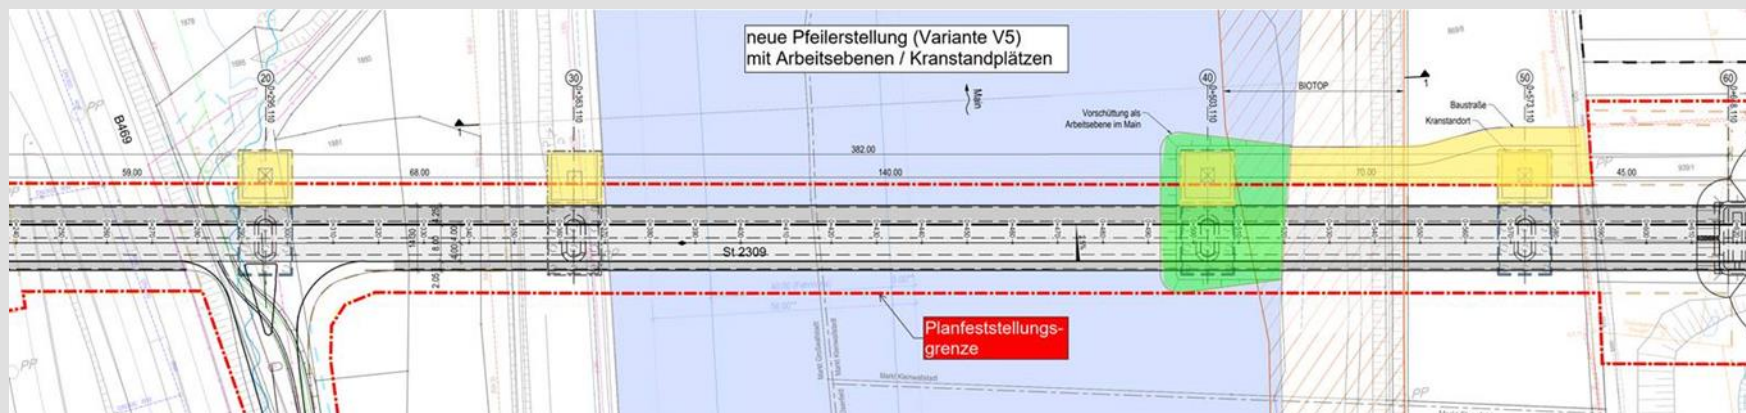



3. Rückblick


2023	(Juni 2023:	Information im Gemeinderat)
	Juni 2023:	Seepeilung ehem. Kiesgrube Bachmann ✓
	Nov. 2023:	rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss ✓
2024	Mai 2024:	Gutachten Baugrunderkundung ✓
	Juni 2024:	Schadstoffuntersuchung Brücke „Neuer Graben“ ✓
	Juli 2024:	Entschädigungsgutachten ehem. Kiesgrube Bachmann
	Juli 2024:	Hydraulische Untersuchung Mainbrücke (Planänderung) ✓
	Okt. 2024:	Abschluss Einholung Stellungnahmen TÖBs (Planänderung) ✓
	Okt. 2024:	ökologische Kartierung (Planänderung) ✓
2025	Dez. 2024:	Ergebnis Variantenuntersuchung Dammbereich ehem. Kiesgrube Bachmann ✓
	Jan. 2025:	Kampfmittelerkundung Mömlingmündung ✓
	Jan. 2025:	Visualisierung ✓



4. Aktueller Maßnahmenstand


Variantenuntersuchung Dammbereich ehem. Kiesgrube Bachmann

Grundlagen: Seepeilung + Baugrunderkundung + Entschädigungsgutachten

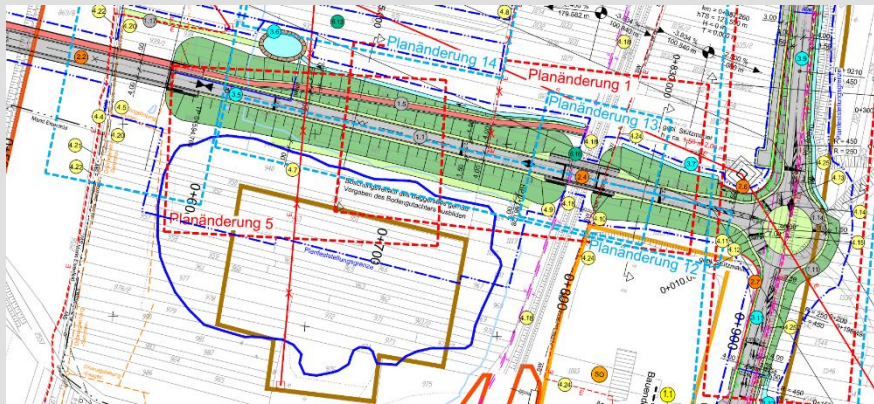

Ergebnis:


kein Ingenieurbauwerk erforderlich / in diesem Bereich keine Änderung der Planfeststellung

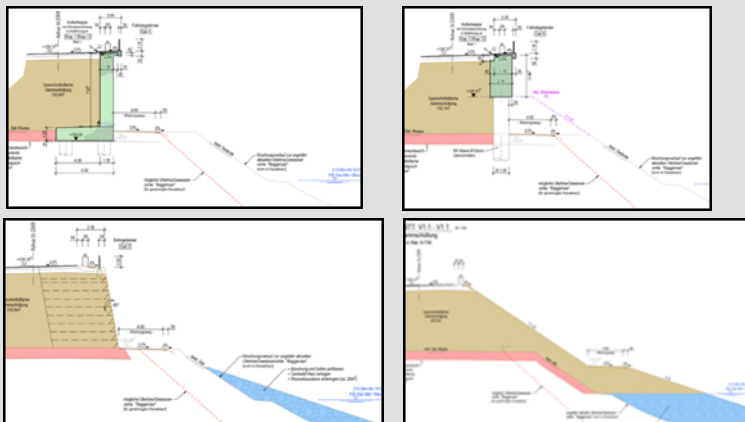



4. Aktueller Maßnahmenstand

Mömlingmündung: Kampfmittelerkundung

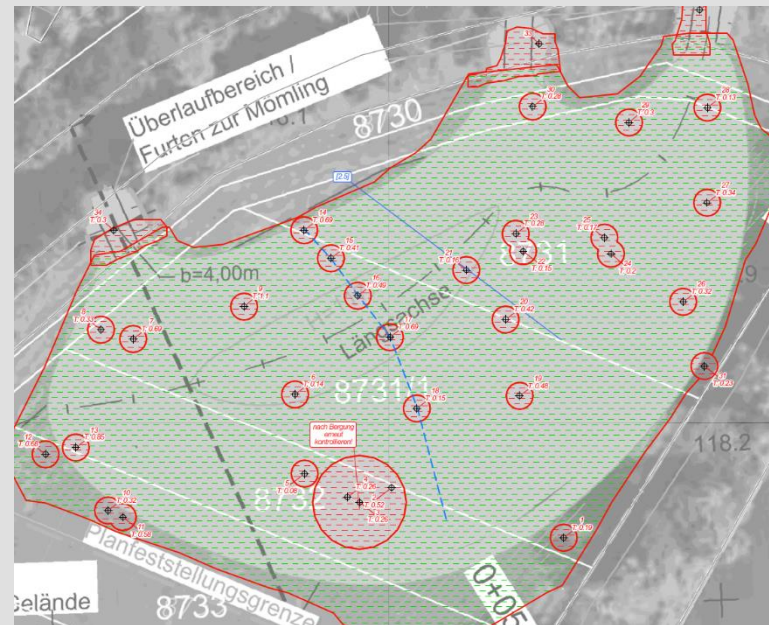

Ergebnis: Verdachtspunkte vorhanden, Räumung erforderlich



4. Aktueller Maßnahmenstand



Vorbereitung Ausschreibungsunterlagen für vorgezogene Landschaftspflegemaßnahmen

Mömlingmündung (E3fcs)

Extensivierung von Uferbereichen an der Mömlingmündung in Obernburg, Schaffung von Lebensraumstrukturen

Ziel:

- Schaffung von grundwasserbeeinflussten Auwald mit Entwicklung zum Sumpfwald und Etablierung von Landröhricht und Hochstaudenbereichen, über gelenkte Sukzession,
- Extensivierung der Ufer- und Aueflächen,
- Verbreiterung der bestehenden Uferstreifen an Mömling und Main,
- Optimierung von Lebensräumen für Fledermäuse durch Schaffung von Ersatzquartieren

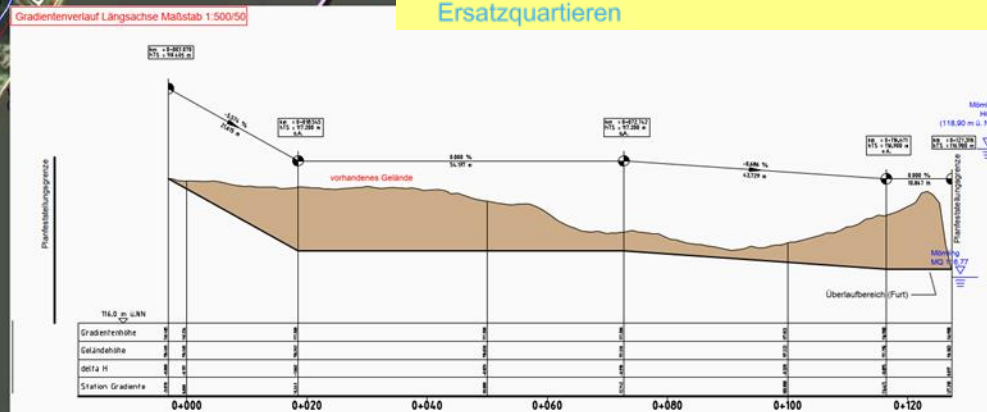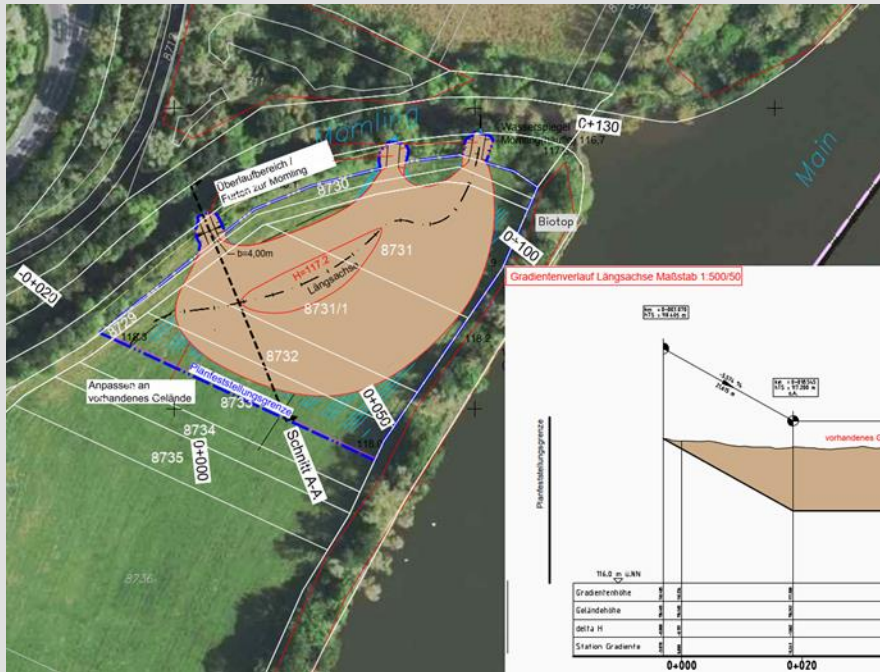



4. Aktueller Maßnahmenstand

Vorbereitung Ausschreibungsunterlagen für vorgezogene Landschaftspflegemaßnahmen

Äußere Seeäcker (A7fcs)



Quelle: google maps

Extensivierung von landwirtschaftlichen Nutzflächen im Bereich Äußere Seeäcker entlang des westlichen Waldrandes und Schaffung von Lebensraumstrukturen

Ziel:

- Schaffung von landschaftstypischen Vegetationsstrukturen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen unter besonderer Berücksichtigung der Ansprüche des Steinkauzes
- Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktion und des günstigen Erhaltungszustandes der Population von Reptilien (v.a. Zauneidechse) und Fledermäusen
- Anlage lebensraumtypischer Kleinstrukturen. Herstellung eines Ausweichlebensraumes für Zauneidechsen.
- Schaffung von Ersatzquartieren für Fledermäuse






4. Aktueller Maßnahmenstand

Vorbereitung Ausschreibungsunterlagen für vorgezogene Landschaftspflegemaßnahmen

Ersatzquartiere für Fledermäuse und Vögel (A13cef)

- 32 Fledermausquartiere
- 2 Überwinterungskästen für Fledermäuse
- 25 Nistkästen für Vögel

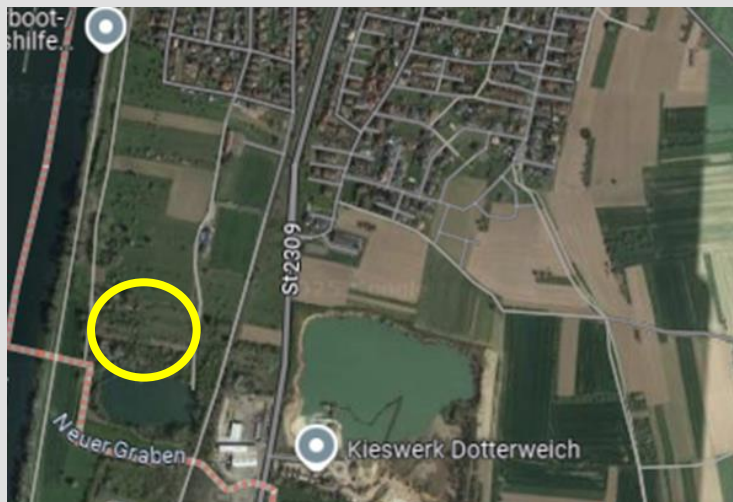

Quelle: google maps





4. Aktueller Maßnahmenstand

Abstimmung mit den beauftragten Planungsbüros

- SRP Schneider + Partner
- Obermeyer GmbH
- Dr. Huck (Landschaftspflege)

für die Fertigstellung der Planänderungsunterlagen und die Erstellung der Förderantragsunterlagen.

Ebenso: Abstimmung mit ferngas / open grid GmbH hinsichtlich der Planung der Umverlegung der Gasleitung (Förderantrag).



5. Ausblick 2025

Durchführung von ersten baulichen Maßnahmen

- (Kampfmittelräumung Mömlingmündung)

- Umsetzung der vorgezogenen Landschaftspflegemaßnahmen
 - Mömlingmündung (E3fcs)
 - Äußere Seeäcker (A7fcs)
 - Ersatzquartiere für Fledermäuse und Vögel (A13cef)



5. Ausblick 2025

Planerische Umsetzungen

- Meilenstein 1: Fertigstellung der Planänderungsunterlagen
 - ➡ zur Einreichung bei der Planfeststellungsbehörde
 - ➡ Ziel: Plangenehmigung

Vorteil: Stellungnahmen TÖBs wurden bereits eingeholt, intensive Vorabstimmung mit der Planfeststellungsbehörde ist erfolgt.

- Meilenstein 2: Fertigstellung der Entwurfsunterlagen für den Förderantrag
(zur Einreichung bei der Förderstelle)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

